		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		**Onderzoek**	**25 days?**	**4/3/17 8:00 AM**	**6/5/17 5:00 PM**		
2		Development setup	5 days?	4/3/17 8:00 AM	4/11/17 5:00 PM		Rein
3		beheers env setup	25 days?	4/3/17 8:00 AM	6/5/17 5:00 PM		Rein;Egon[20%]
4		Ontwerp document	21 days	4/3/17 8:00 AM	5/30/17 5:00 PM		Rein
5		**Docker containers**	**19.053 da...**	**5/17/17 8:00 AM**	**7/3/17 8:25 AM**		
6		mariadb	4 days	5/17/17 8:00 AM	5/24/17 5:00 PM		Egon[80%];Rein[20%]
7		RabbitMQ	7.667 days	5/17/17 8:00 AM	6/5/17 2:20 PM		Wim[80%];Rein[20%]
8		**Authentification**	**5.024 day...**	**6/5/17 2:20 PM**	**6/14/17 2:31 PM**	**7**	
9		keystone	1.339 days	6/5/17 2:20 PM	6/7/17 8:02 AM		Rein;Wim[80%];Egon[8...
10		ldap plugin	3.685 days?	6/7/17 8:02 AM	6/14/17 2:31 PM	9	Rein;Wim[80%];Egon[8...
11		horizon	0.6 days?	6/14/17 2:31 PM	6/19/17 10:19 AM	9;10	Rein[20%];Egon[80%]
12		glance	0.6 days	6/14/17 2:31 PM	6/19/17 10:19 AM	10	Rein[20%];Wim[80%]
13		cinder	0.6 days	6/14/17 2:31 PM	6/19/17 10:19 AM	9;10	Rein[20%];Egon[80%]
14		**compute**	**5.762 day...**	**6/19/17 10:19 AM**	**7/3/17 8:25 AM**	**13**	
15		nova	1 day	6/19/17 10:19 AM	6/20/17 10:19 AM		Rein[40%];Wim[80%];Eg...
16		**Networking**	**4.762 day...**	**6/20/17 10:19 AM**	**7/3/17 8:25 AM**	**15**	
17		Neutron	2.381 days?	6/20/17 10:19 AM	6/26/17 2:22 PM	15	Rein[50%];Wim[80%];Eg...
18		contrail	2.381 days?	6/26/17 2:22 PM	7/3/17 8:25 AM	17	Rein[50%];Wim[80%];Eg...
19		External MPLS	15 days?	7/3/17 8:25 AM	8/7/17 8:25 AM	16;15	
20		Federation	15 days?	8/7/17 8:25 AM	9/6/17 8:25 AM	19	
21		Automated Install env.	10 days	9/6/17 8:25 AM	9/20/17 8:25 AM	20	

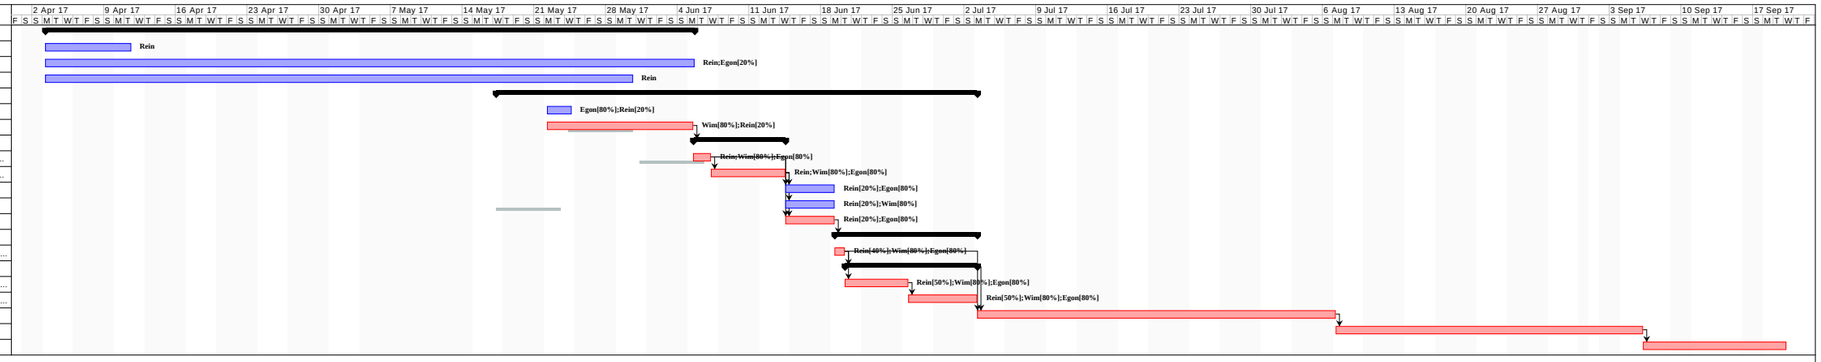

24 Sep 17							1 Oct 17							8 Oct 17							15 Oct 17						
S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F
